

Pac-Man

31 mai 2026

Chef de projet
Dates du projet

Lis Ambre
27 nov. 2025 - 30 mai 2026

Avancée
Tâches
Ressources

100%
35
1

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Prise en main du sujet - Tout le monde	27/11/2025	27/11/2025
Création du trello - Ambre	27/11/2025	27/11/2025
Répartition des tâches et priorisation - Ambre	27/11/2025	27/11/2025
Création du git pour le code - Karim	27/11/2025	27/11/2025
Création du git pour les documents - Haoxuan	27/11/2025	27/11/2025
Mise en place du projet de base (code + unity) - Karim	28/11/2025	28/11/2025
Génération des sprites - Karim	28/11/2025	28/11/2025
Conception du diagramme de cas d'utilisation - Imane & Ambre	01/12/2025	03/12/2025
Conception du diagramme d'activité - Imane & Ambre	04/12/2025	05/12/2025
Conception du diagramme d'état transition fantome - Karim	08/12/2025	10/12/2025
Conception du diagramme d'état transition pacman - Haoxuan	11/12/2025	12/12/2025
Conception du diagramme de classe - Tout le monde	22/12/2025	23/12/2025
Création de la map 1 - Karim & Haoxuan	05/01/2026	06/01/2026
Création du pacman - Imane & Karim	07/01/2026	08/01/2026
Création des fantomes - Karim & Ambre	09/01/2026	12/01/2026
Développement des interactions avancer, reculer, descendre, monter - Karim, Imane, Ambre	19/01/2026	20/01/2026
Création d'une super pastille - Haoxuan	20/01/2026	21/01/2026
Développement des collisions avec les pastilles - Imane	21/01/2026	22/01/2026
Développement des collisions avec le mur - Karim, Imane, Ambre	22/01/2026	23/01/2026
Développement de la collision avec un fantome et de son déplacement - Karim & Ambre	23/01/2026	23/01/2026
Création de 4 comportements des fantomes - Karim, Imane, Ambre	02/02/2026	04/02/2026
Développement du menu - Imane & Ambre	05/02/2026	06/02/2026
Affichage du game over quand le joueur perd la partie - Karim & Ambre	16/02/2026	17/02/2026
Créer un bouton pour recommencer une partie - Ambre	18/02/2026	19/02/2026
Développement du score de la partie et du nombre de vie - Karim	19/02/2026	20/02/2026
Générateur de map - Haoxuan	02/03/2026	04/03/2026

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
Création de la map 2 - Karim & Haoxuan	05/03/2026	06/03/2026
Ajout des niveaux de jeux facile-moyen-difficile - Karim	16/03/2026	17/03/2026
Refactorisation du code avec notre uml - Tout le monde	18/03/2026	08/05/2026
Réglage des parametres d'une partie (vitesse du pacman, des fantomes, de la super pastille, et du temps de prison des fantomes) - Karim	11/05/2026	11/05/2026
Régler le nombre de fantomes d'une partie - Haoxuan	12/05/2026	12/05/2026
IA des fantômes et entraînement - Haoxuan	13/05/2026	15/05/2026
Correction de bugs du code - Tout le monde	18/05/2026	22/05/2026
Documentation (rédaction rapport + tri et rendu) - Tout le monde	25/05/2026	29/05/2026
Rendu final - Tout le monde	29/05/2026	29/05/2026

Ressources

4

Nom	Rôle par défaut
Lis Ambre	Chef de projet

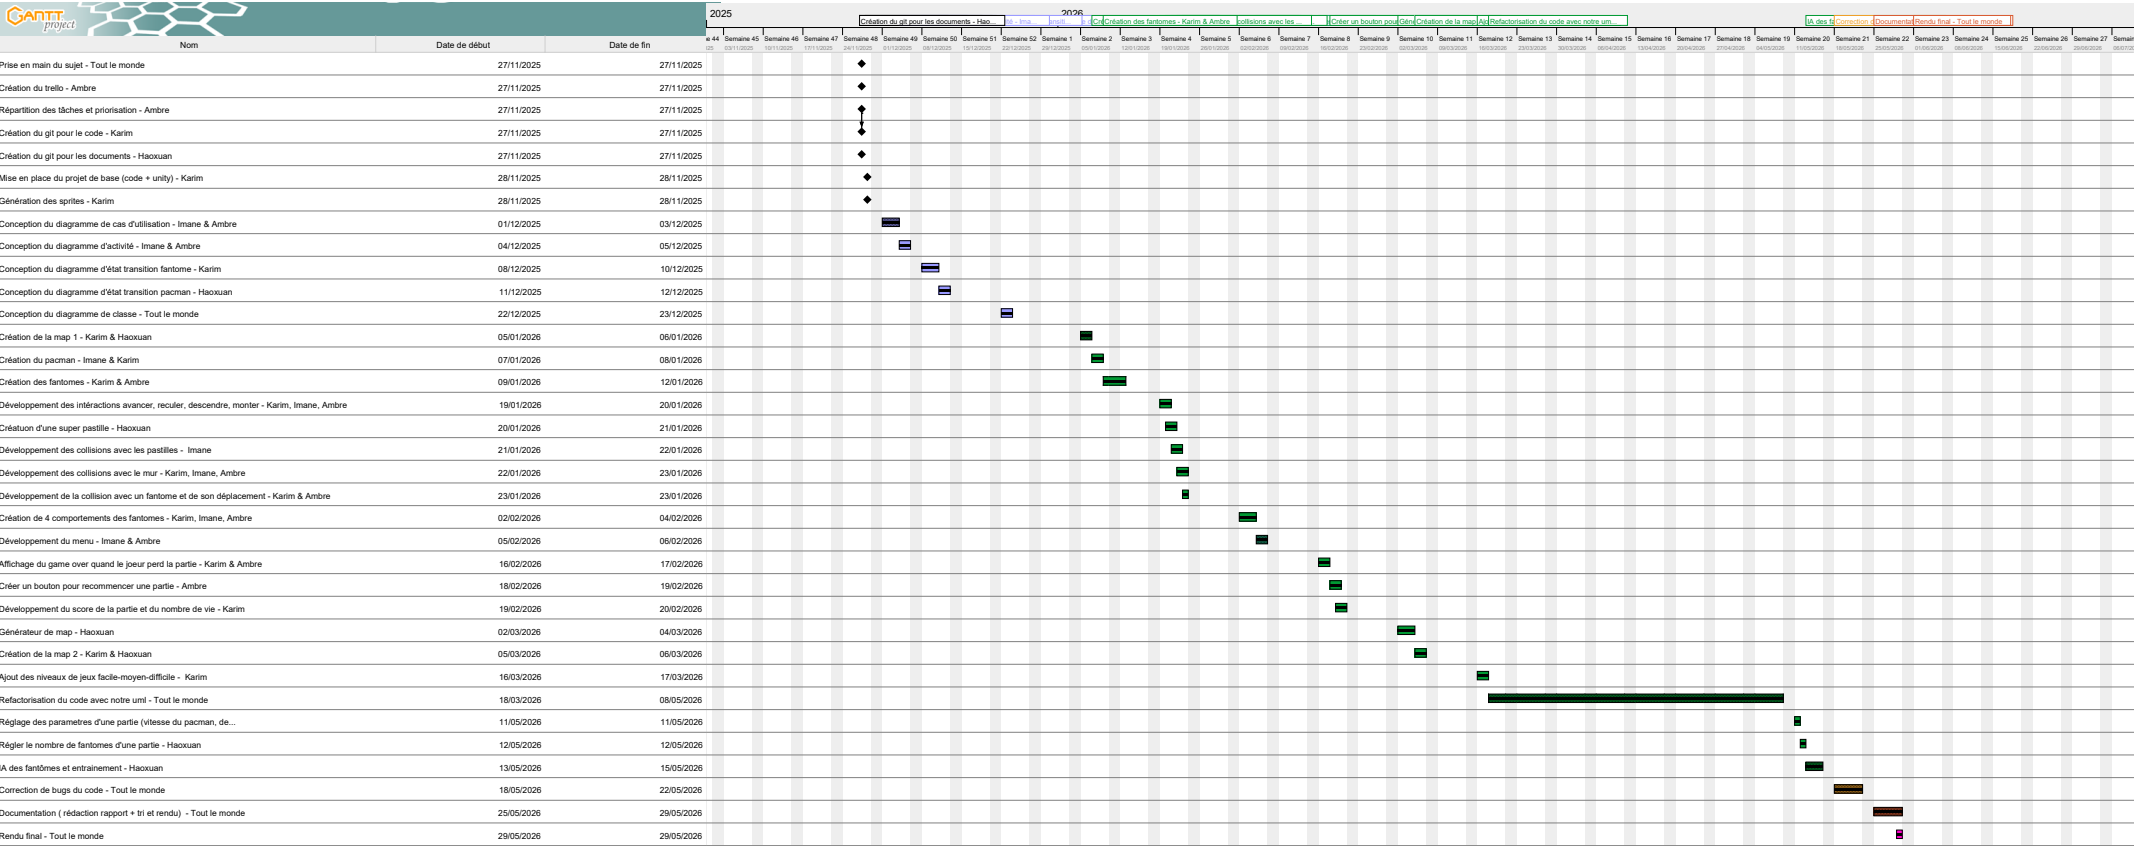


Diagramme des Ressources

